Reforma del centre mèdic de N'Gabacoro Droit (Mali)

1 INTRODUCCIÓ

El projecte *Salut i riures a Mali, Djouma* va néixer l'octubre del 2015 de la mà de la Marina Palmés i jo mateixa, Laia Dosta, amb l'objectiu de reformar el CSCOM de N'Gabacoro Droit.

Havíem passat l'estiu a Bamako com a voluntàries del projecte *ABÉCÉ* de CC ONG Ajuda al Desenvolupament i durant la nostra estada vam anar a visitar el poble de Sala, als afores de Bamako. Al costat d'aquest, hi ha el centre mèdic comunitari de N'Gabacoro Droit, que està al servei d'uns 10 000 habitants. Tal com es pot comprovar a les fotografies de l'annex 1, es trobava en unes condicions deplorables.

La mort de la Djouma, una nena de 5 mesos que vivia a davant del centre mèdic, va ser el detonant que ens va fer engegar el projecte amb l'incondicional suport de CC ONG Ajuda al Desenvolupament. Un cop més, gràcies Rafael Jariod per animar a dues noies sense experiència a enfrontar aquest repte!

A continuació, procediré a presentar els pressuposts inicials, les dues línies d'actuació (finançament i difusió) a Catalunya, el desenvolupament de les obres i els costs d'aquestes. Adjuntades als annexos, podreu trobar les fotografies de tot el procés així com les diferents factures.

2 PRESSUPOST INICIAL

Al setembre del 2015, abans de la meva tornada a Barcelona, vaig demanar un pressupost de la reforma del centre. Adjunto a continuació la informació que em van enviar:

2.1. Pintura

Elements	Preu unitari	Quantitat	Total en F CFA	Total en Euros
Fomme intérieure	10000 F cfa	10 bidons	100 000	152,67
Fomme extérieure	13500 F cfa	6 bidons	78 000	119,08
Peinture à huile	1250 F cfa	40 kg	50 000	76,34
Colorant	1000 F cfa	13 bidons	13 000	19,85
Essence Diluant	700 F cfa	20 litres	14 000	21,37
Mà d'obra			200 000	305,34
Total			**455 000**	**694,66**

2.2. Sostre interior

Elements	Preu unitari	Quantitat	Total en F CFA	Total en Euros
Plafond	700 F cfa	125	87 500	133,59
Pointes n° 8	1000 F cfa	12	12 000	18,32
Pointes n° 3	1000 F cfa	15	15 000	22,90
Pointes n°10	1000 F cfa	10	10 000	15,27
Planche fond 30	1500 F cfa	45	67 500	103,05
Mà d'obra			250 000	381,68
Total			**442000**	**674,81**

2.3. Instal·lació elèctrica

2.3.1. Circuit elèctric existent

Elements	Quantitat	Preu unitari	Total en F CFA	Total en Euros
Files 1,5mm	12 rouleaux	7 500	**90 000**	**137,40**
Files 2,5mmm	9 rouleaux	12 000	**108 000**	**164,88**
Ampoule économique(TMT)	16	1 500	**24 000**	**36,64**
Douille	17	1 000	**16 000**	**24,43**
Contact simple allumage	10	500	**5 000**	**7,63**
Prise avec terre	24	750	**180 000**	**274,81**
Ventilateur plafonnier(TMT)	11	25 000	**275 000**	**419,85**
Boite PT3	8	750	**6 000**	**9,16**
Coffre 24 voies	1	75 000	**7 500**	**11,45**

Table en verre complet	14	5 000	**70 000**	**106,87**
Boite ronde	56	100	**56 000**	**85,50**
Contact double allumage	6	750	**45 000**	**68,70**
Total			**629 600**	**961,22**

2.3.2. Circuit de panells

Elements	**Quantitat**	**Preu unitari**	**Total en F CFA**	**Total en Euros**
Files 2,5mm souple	2 rouleaux	45 000	**90 000**	**137,40**
Files 4mm souple	30m	1 000	**30 000**	**45,80**
Ampoule économique de panneaux	30	2 000	**60 000**	**91,60**
Douille	30	1 000	**30 000**	**45,80**
Contact simple allumage	10	500	**5 000**	**7,63**
Contact double allumage	6	750	**4 500**	**6,87**
Attache N°8	2 paquets	500	**1 000**	**1,53**
Panneaux Solaires 230 watt	2	85 000	**170 000**	**259,54**
Batterie 120 watt	4	65 000	**260 000**	**396,95**
Régulateur onduleur (inducteur charge)	1	15 000	**15 000**	**22,90**
Mà d'obra	1	350 000	**350 000**	**534,35**
Total			**1 015 500**	**1550,38**

2.4. Pressupost total

Elements	**Total en F CFA**	**Total en Euros**
Pressupost del circuit elèctric	629 600	961,22
Pressupost del circuit de panells	665 500	1016,03
Mà d'obra per a la instal·lació elèctrica	350 000	534,35
Pressupost per a la pintura	255 000	389,31
Mà d'obra per a la pintura	200 000	305,34
Pressupost per a la reforma del sostre	192 000	293,13
Mà d'obra per a la reforma del sostre	250 000	381,68
Total	**2 542 100 FCFA**	**3881,07 €**

3 FINANÇAMENT

A continuació procediré a detallar com s'ha finançat el projecte.

3.1. Guardioles solidàries

Al llarg de l'any hem col·locat un total de XX guardioles en diferents establiments catalans que ens han permès aconseguir més de 600 € i molta difusió del projecte. En l'annex III trobareu les entitats i comerços que han col·laborat posant una guardiola solidària en el seu espai.

Guardiola al bar *3r Tiempo Sports La Pava* (Gavà)

3.2. Calendaris solidaris

Utilitzant fotografies de Mali i reflexions de creació pròpia vam fer un calendari amb l'ajuda en maquetació de la Chiara Bulgarelli. Vam fer dues comandes, un total de 230 calendaris impresos a *Bramona Impressió Digital*. El preu de venda era de 10 €, així que vam obtenir 2300 € bruts.

A més, els calendaris ens van servir per difondre la causa i crear ressò del projecte.

3.3. Sant Jordi a Igualada

En motiu de la diada de Sant Jordi, vam muntar una parada a Igualada per vendre roses, llibres de segona mà i uns desplegables, maquetats per la Marta Garcia i impresos a *802 Graphic Service*, fets amb fotografies de creació pròpia on s'explicava la nostra història. A més, hi havia una guardiola on es podien fer donatius.

Vam obtenir un benefici net de 543.18€ i moltíssima difusió dins la població d'Igualada.

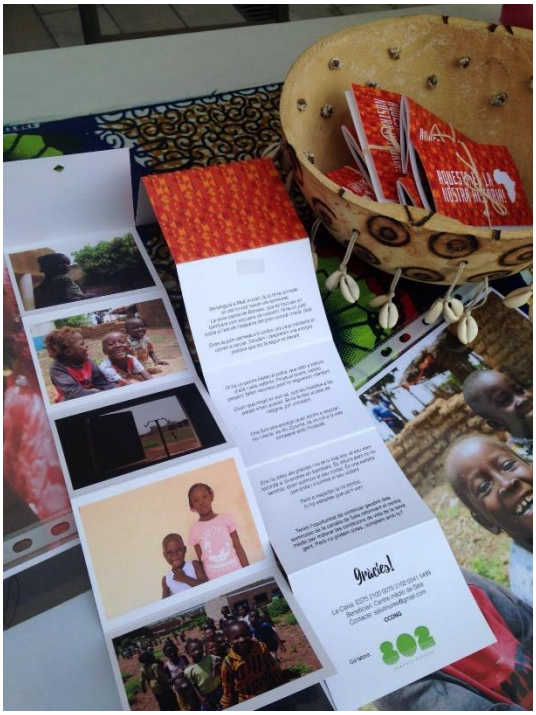
Gràcies!

AMPA
DOLORS MARTÍ
natació
anglès
UNA ROSA PER
UN HOSPITAL
A MALI
SALUT I RIURES
A MALI, DJIKIMA
30
A LA VOLUNTAT
POSA TU
EL PREU
FIGUERES

3.4. Parada de segona mà al Flea Market

El 12 de juny la Neus Casajuana i l'Ariadna Ruiz van muntar una parada per vendre roba i accessoris de segona mà. Els 146,05 € de benefici net aconseguits van destinar-se a la nostra causa.

3.5. Campanya a migranodearena.org

El 19 de maig vam encetar un repte a la campanya de microdonacions *migranodearena.org* amb l'objectiu d'assolir els diners restants per a finançar la reforma del centre mèdic. Com es pot observar en la fotografia a continuació, vam superar les expectatives recaptant 2010 € en un total de 29 donatius.

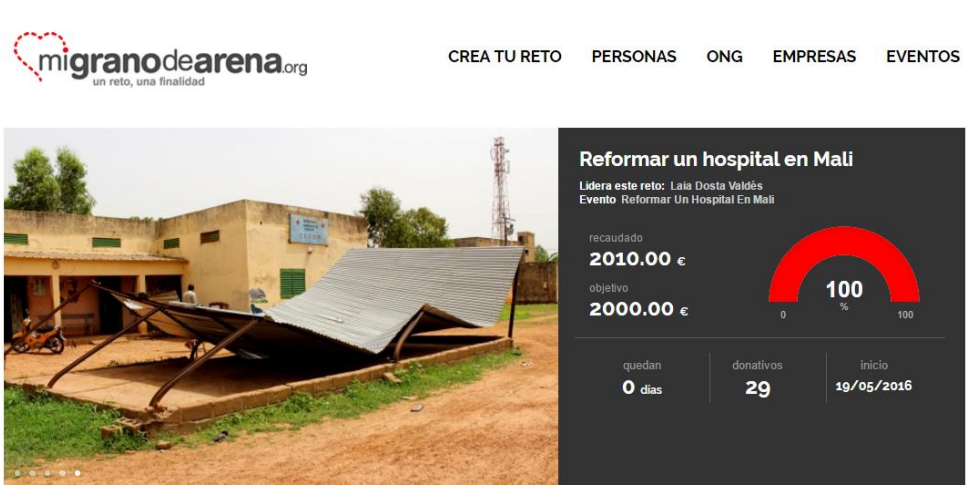

3.6. Donatius

A més a més de totes les activitats mencionades anteriorment, en el transcurs de l'any hem anat rebent donacions al compte bancari de CC ONG Ajuda al Desenvolupament sota el nostre concepte.

4 DIFUSIÓ

4.1. Pàgina de Facebook

Des del moment que vam crear el projecte sabíem que era imprescindible tenir una pàgina al Facebook per donar a conèixer la nostra causa. És a través d'aquesta xarxa social com hem aconseguit bona part dels nostres col·laboradors i donants. Avui dia, (22 d'octubre del 2016) la nostra pàgina té un total de 645 seguidors.

4.2. Xerrada al S.I. Turó d'en Baldiri (Teià)

El 17 de juny vaig fer una xerrada als alumnes de 3r de l'ESO del S.I. Turó d'en Baldiri de Teià amb l'objectiu d'explicar-los la meva experiència a Mali a través dels projectes *ABÉCÉ* i *Salut i riures a Mali, Djouma*. Va ser una bona activitat de conscienciació; tant l'alumnat com el professorat van sortir molt contents de la xerrada i han demanat que es continuï realitzant anualment.

4.3. Presència als mitjans de comunicació

Gràcies al ressò aconseguit mitjançant la pàgina de Facebook, es va posar en contacte amb mi Catalunya Ràdio per entrevistar-me en el programa *La nit dels ignorants 2.0: 2ª hora*. Adjunto l'enllaç al podcast, on podreu escoltar l'entrevista a partir del minut 25:25: http://bit.ly/1SvJJdO

5 DESENVOLUPAMENT DE LA REFORMA

A continuació procediré a explicar en què van consistir les obres del CSCOM de N'Gabacoro Droit, dutes a terme entre el juliol i el setembre de l'any 2016:

1. Neteja d'herbes i residus del voltant del centre mèdic.
2. Reparació del sostre exterior per evitar l'entrada d'aigua i insectes.
3. Reparació i substitució dels plafons del sostre interior trencats i podrits.
4. Substitució del cablejat elèctric inutilitzable per un de nou que es va col·locar en l'interior de les parets.
5. Instal·lació d'endolls en sales on pràcticament no n'hi havia.

6. Substitució de ventiladors i bombetes inutilitzables.
7. Reparació d'una aixeta que perdia aigua.
8. Reparació dels forats en les parets interiors.
9. Substitució de les finestres de ventilació superiors podrides.
10. Pintura exterior, en dos colors segons la zona.
11. Substitució o instal·lació de mosquiteres en les finestres que no en tenien o estaven trencades.
12. Pintura de les parets interiors en dos colors: una fàcil de netejar fins als 1.80 m aproximadament d'alçada i una altra de convencional per la paret restant.
13. Reparació del mobiliari: lliteres de part, llits i armari-farmaciola.
14. Reparació de les fundes de matalassos trencades.
15. Compra d'un nou matalàs
16. Pintura del mobiliari.
17. Instal·lació de 3 plafons resistents per a penjar informació.
18. Col·locació de llistons de fusta on penjar les mosquiteres, de les quals ja disposava el centre, damunt dels llits.
19. Reparació del cablejat elèctric dels serveis, que es troben a l'exterior del centre.
20. Substitució de les bombetes inutilitzables dels serveis.
21. Pintura de la caseta on es troben els serveis.

Com es pot comprovar, la reforma va incloure coses que no es trobaven en el pressupost inicial bé sigui perquè en el seu moment desconeixíem el preu o perquè simplement desconeixíem l'existència del problema – com és el cas de les obres de la caseta dels serveis i la seva electrificació.

Pel que fa a la mà d'obra contractada, va funcionar en tres equips: sostre i fusteria, electrificació i aigua i pintura. La neteja exterior del centre la van realitzar voluntàriament jovent de la zona i membres de l'associació *Solidarité Action Plus(SAP- Club Mali).*

Vull aprofitar per agrair el cop de mà que vam rebre per part dels voluntaris del projecte *ABÉCÉ*: Marta, Dani, Enrique, Rut i Natalia; així com de l'Abdourahamane Sangare, Monsieur le Maire que va fer-me de xofer, traductor i assistent en tot moment. I m'agradaria fer també una menció especial a la Marina Palmés i a l'Alba Garcia, que tot i haver treballat molt durant tot l'any no van poder ser amb mi sobre terreny.

6 COSTS

Concepte	Cost (FCFA)	Cost (€)
Gasoil (per anar des de Titibougou fins el CSCOM)	10.000	15,38
Gasoil	2.500	3,85
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	5.000	7,69
Gasoil	10.000	15,38
Gasoil	10.000	15,38
Gasoil	10.000	15,38
Fusteria	79.000	121,54
Reparació matalassos	75.000	115,38
Electrificació	888.000	1.366,15
Electrificació extra pels serveis	40.000	61,54
Pintor	1.062.500	1.634,62
Pintura extra + mà d'obra	40.000	61,54
Pintura cartell + mà d'obra	20.000	30,77
Reparació mosquiteres de les finestres i llitera de part	90.000	138,46
Finestres superiors de ventilació amb mosquitera	272.000	418,46
Reparació sostre i parets	267.250	411,15
Compra d'un matalàs	25.000	38,46
Fundes protectores per matalassos	60.000	92,31
Fustes per les mosquiteres dels llits	27.000	41,54
Tractament mèdic per alumne del projecte ABÉCÉ	37.340	57,45
Total (aprox, degut a alguns costs sense factura)	**3.060.590 FCFA**	**4.708,60 €**

7 AGRAÏMENTS

Aquest projecte que va néixer fa tot just un any ha estat una gran experiència que m'ha fet créixer emocional i professionalment. He hagut d'espavilar-me amb la comunicació intercultural, buscar finançament, aprendre a gestionar grups i a escoltar; escoltar molt. Crec que el que hem aconseguit en aquest any és un exemple més de què, si volem, petites persones organitzades poden millorar aquest món tan desequilibrat.

Tot l'esforç que ha suposat recaptar els diners per a la reforma, obtenir difusió i treballar sobre terreny no hagués estat possible sense l'incondicional suport de CC ONG, del Rafael Jariod i de les moltíssimes persones - que no menciono perquè m'oblidaria a algú- que han estat al meu costat en tota aquesta aventura.

Gràcies a tots els que m'heu animat a seguir endavant quan les coses s'encallaven, als que m'heu recordat la meva filosofia *doni doni* quan semblava oblidar-la i als que m'heu abraçat a la tornada que ja sabem que mai és tan fàcil.

Un cop més: gràcies, salut i riures!

ANNEX I: FOTOGRAFIES PRÈVIES A LA REFORMA

ANNEX II: FOTOGRAFIES DE LA REFORMA

BONNE ALIMENTATION
BONNE SANTE!

BlueStar
CPN
SALLE DE GARDE

SALLE DES SOINS

Finestres superiors de ventilació podrides.

El doctor fent formació al personal mèdic de la zona de N'Gabacoro.

Noves finestres superiors de ventilació amb mosquitera interior.

VINYL-INTER

DETECTO

Nou matalàs.

Reunió amb l'associació *Solidarité Action Plus* i el jovent de la zona.

Cerimònia de finalització de les obres.

CENTRE DE SANTE
COMMUNAUTAIRE DE N'GABACORO
Rénové par CC-ONG Catalunya Espagne en partenariat
PROJECT : Salut i riues a Mali « DJOUMA »
Piloté par Laia Dosta Valdes
Août 2016

ANNEX III: FACTURES

GENERAL TRADING
QUALITY & PERFORMANCE
Titibougou Route de Koulikoro
Tél : 66 72 17 55 Bamako-MALI

BPF 2500f

Reçu N° 01415

De M. CCONG

La somme de : 2500F

Motif : GASOIL

Bamako, le 01/08/2016

STATION KASSE & FRERES
Tél :(+223) 66 43 22 89 / 76 43 43 22 89
Bamako Rép. du Mali

B.P.F 10.000 F

Reçu de : CCONG

La somme de :

Motif : Gazoil 20,00 liter

N° :

Le 13 - 08 20.16

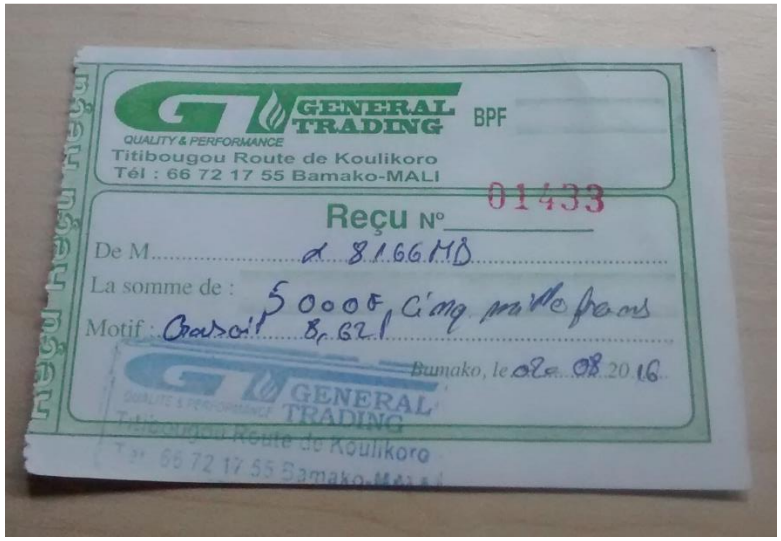

GENERAL TRADING
QUALITY & PERFORMANCE
Titibougou Route de Koulikoro
Tél : 66 72 17 55 Bamako-MALI

BPF

Reçu N° 01433

De M. 2 8166 MD

La somme de : 5000F, Cinq mille francs

Motif : Gasoil 8,62 l

Bamako, le 02.08.2016

ORYX ENERGIES

Reçu 0028525

CLIENT :

DATE : 12/08/16

Produits	Litres	P.U	Montant
Gasoil	8,59	582	5000

Montant en lettres : Cinq mille francs

Le Gérant

C.C.D.N.G

ORYX ENERGIES

Reçu 0028519

CLIENT :

DATE : Le 11-8-2016

Produits	Litres	P.U	Montant
Gasoil	8,47	590	5000

Montant en lettres : Cinq mille francs CFA

Le Gérant

QUINCAILLERIE ET DIVERS

Chez Bakari KOUREKAMA dit Mafa
Face au Champ Hippique de Missira
Tél : 64 22 52 17 / 70 91 92 93 - Bamako – Mali

FACTURE N°.....

Bamako, le 28/07/2016

DOIT : CC-ONG-

Qtés	Désignation	P.U	Montant
15	mètre gaudron x 20cm	5000	75000
10	feuilles de plafonds	3000	30000
1	Sac de Ciment	4750	4750
1	Planche de bois	17500	17500
1	Bouteille de Gaz		40000
1	Mais d'œuvre Forfait	100000	100000
		TOTAL	267250

QUINCAILLERIE ET DIVERS

Arrêté la présente FACTURE à la somme de : Deux Cent Soixante Sept mille deux cent cinquante

Pour

QUINCAILLERIE ET DIVERS
Chez BAKARI KOUREKAMA dit MAFA
Face au Champ Hippique de Missira
Tél: (+223) 64 22 17 / 70 91 92 93 Bko - Mali

QUINCAILLERIE ET DIVERS
Chez BAKARI KOUREKAMA dit MAFA
Face au Champ Hippique de Missira
Tél: (+223) 64 22 17 / 70 91 92 93 Bko - Mali

FACTURE N°

le 04/02/2015

Doit : C.C. ONG

Qté	Désignation	P.U	Montant
13	Fenetre Metalliques	20000	260000
01	Moustiquaire (1 Rouleau)	12000	12000
		TOTAL	272000

Arrêtée le présent facture à la somme de : Deux Cent Soixante Douze mille francs

Pour Acquit

KASSOGUE
MEUBLE
PLATEAU
BKO

JOIGHIL
MENUISIER
BANGUNI
FACF

KASSOGUE
METALLERIE
PLATEAU
DOGUNI
BKO

FACTURE N°

Doit CC ONG — le 02/08 2016

Qté	Désignation	P.U	Montant
03	Confection cadre Fenêtre métallique	15000	45000
05	Reparation Moustiquaire	6000	30000
01	Reparation Table accouchement	15000	15000
	TOTAL		90 000

Arrêtée la présente facture à la somme de: Quatre Vingt Dix mille Francs cfa

Pour Acquit

KASSOOL METALLIQUE PLATEAU MOSQUE DOGUNI FIKO

DJIBRIL MENUISIER BANGONI FACE MOSQUE KASSOOL METALLIQUE PLATEAU DOGUNI FIKO

Le Fournisseur

FACTURE N°

BOURAMA KARAMBE COMMERCANT DE BOIS FACE RESIDENCE TEL KZ. GHAR. KONI BP. 20 FITI DOUNOU CELL. 20.22.61.66.61.66.FEP.DU.MALI.

Doit CC ONG — le 11/08 2016

Qté	Désignation	P.U	Montant
1	Porte de Peinture	25000	25000
1	Nain d'ecurie	15000	15 000
	TOTAL		40 000

Arrêtée la présente facture à la somme de: Quarante mille francs cfa

Pour Acquit

BOURAMA KARAMBE COMMERCANT DE BOIS FACE RESIDENCE TEL KZ. GHAR. KONI BP. 20 FITI DOUNOU CELL. 20.22.61.66.61.66.FEP.DU.MALI.

Le Fournisseur

BOURAMA KARAMBE COMMERCANT DE BOIS FACE RESIDENCE TEL KZ. GHAR. KONI BP. 20 FITI DOUNOU CELL. 20.22.61.66.61.66.FEP.DU.MALI.

QUINCAILLERIE SYLLA

TMT INGELEC
Quincaillerie & Divers
Imm. TANDIA Marché Médine
BP.E: 781 - Tél: 66 14 70 89 / 76 14 70 89
76 21 49 82 Mag. 417 - Bamako - Mali

FACTURE N° 0400 Bamako, le 04/08 2016

Doit: CC ONG

Qté	Désignation	Prix. U	Montant
15	Peinture Boite Fom Extérieur	16500	247 500
20	Peinture Boite Fom Intérieur	13500	270 000
08	Sacom-Peinture 20kg Sable	35 000	280 000
25	Boites cabronte Illuto	2 000	50 000
02	Boite Peinture 1Kg bleu	5000	10 000
01	Boite Peinture 1Kg Noir	5000	5000
50	litres de diluant	1000	50 000
	Total Materiels	9%	912 500
	Main d'oeuvre		150 000
	TOTAL		1 062 500

Arrêtée la présente facture à la somme de : Un million soixante deux mille cinq cent francs CFA

Pour Acquit

Le Fournisseur

QUINCAILLERIE SYLLA

TMT INGELEC
Quincaillerie & Divers
Imm. TANDIA Marché Médine
BP.E: 781 - Tél: 66 14 70 89 / 76 14 70 89
76 21 49 82 Mag. 417 - Bamako - Mali

FACTURE N° 0399 Bamako, le 28/07 2016

Doit: CC ONG

Qté	Désignation	Prix. U	Montant
02	Rouleaux TH4	30 000	60 000
05	Rouleaux TH4	24 000	120 000
01	Rouleaux Laine 11	15 000	15 000
01	Rouleaux Laine 9	12 500	12 500
20	Prises	750	15 000
10	Ventilateur TMT+Nesson	35 000	350 000
04	Douille Ronde+Ampoules	10 000	40 000
20	Douille en Vis	1 500	30 000
05	Interrupteur Double Allumage	1 000	5 000
25	Ampoules	2 000	50 000
15	Interrupteur Simple Allumage	700	10 500
10	Kg de platre	500	5 000
50	mètres de cables 2x6mm2x6	2 500	125 000
50	mètres de cable 2x1,5	1000	50 000
	TOTAL		888 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : Huit cent quatre vingt huit mille CFA

Pour Acquit

Le Fournisseur

HAMADOU GOULAKAN
Tapissier – Ebénier – Garnisseur
En Face de 6ème ARR Korofina
Bamako (MALI)
TEL : 63 00 99 01 / 79247664

Bamako, le 12/03/2016

FACTURE

TRAVAUX : Revellement Matela

Doit : C.C. O.V.G.

Désignation	Qté	P.U	Montant
Revellement Matela	6	12500	75000
Total Matériaux			
Main d'œuvre			
TOTAL GENERAL			75000

Arrêter la présente facture à la somme de : Soixant Quinze mille francs (75000)

Pour Acquit

Le Fournisseur

BOURAMA KARAMBE
COMMERCANT DE BOIS
PAGE PRESIDENTIEL 1ER AV. LMAR KONE
AV. TITI DOUGOU C.I.
79.24.61.40 @ YAHOO.FR

FACTURE N°

10/02/2016

Doit: CC-046

Qté	Designation	P.U	Montant
3	feuilles Contre plaqué	8000	24000
1	Planche 6m	15000	15000
3	Litres de Vernis	1500	4500
2	Serrure à clef armoire	1500	3000
1	Pointes Kg	1000	1000
4	Paires de Pommelles	300	1200
1	Paquet de vis	300	300
1	Transport	5000	5000
1	Main d'oeuvre	25000	25000
		TOTAL	79000

Arrêtée la présente facture à la somme de: Soixante Dix Neuf Mille Francs CFA

Payé le 10

Par Acquit

BOURAMA KARAMBE
COMMERCANT DE BOIS
PAGE PRESIDENTIEL 1ER AV. LMAR KONE
AV. TITI DOUGOU C.I.
79.24.61.40 @ YAHOO.FR

Le Fournisseur

BOURAMA KARAMBE
COMMERCANT DE BOIS
PAGE PRESIDENTIEL 1ER AV. LMAR KONE
AV. TITI DOUGOU C.I.
79.24.61.40 @ YAHOO.FR

Abdoul Hayoub Maïga

N° de Tél: 76-23-93-60

Amadou: 76-44-16-91

YAMADOU KOUYATE & FILS

Vendeur de Matelas Fofy - Chaises - Chateaux d'Eau.

Tél: (+223) 66 18 13 45 | Tél: (+223) 94 17 94 78
Tél: (+223) 76 18 13 45 | Tél: (+223) 74 17 61 56
Tél: 98 26 33 94

Route de Koulouikoro à Sotuba imm Sodouf/ Bamako Rép. Du Mali

FACTURE N° 1

Bamako, le 19 08 2016

Doit : 4 CCONS

Qté	Désignation	P. Unit.	Montant
1	Matelas 2L 90 x 1.2	25000	25.000
	Payer Livrer		
	TOTAL :		25000

Arrêté la présente facture à la somme de : Vingt cinq mille francs CFA

Pour Acquit

Le Fournisseur

PAYE LIVRE

MOHAMED DOUCOURE

Vendeur de Boi

CONTRE PLAQUE ET MULTIPLIES
B.P: E 2579 - Tél: 79 22 99 43 / 66 64 26 57
Boulkassoumbougou Face SODOUF Bamako Rép.du Mali

FACTURE N°

Bamako, le 18 08 2016

Doit CCONS

Qté	Désignation	P. Unitaire	Montant
36	Baquettes	750f	27000f
	TOTAL		# 27 000 f

Mohamed DOUCOURE Vendeur de Bois BP : E 2579 Tél : 922 99 43 Boulkassoumbougou Face SODOUF

Arrêté la présente facture à la somme de : Vingt sept mille francs CFA

Pour Acquit

Le Fournisseur

QUINCAILLERIE - ELECTRONIC

& Divers
Chez Karamoko SACKO
Imm. Mamé TRAORE - Tél.: 66 77 99 34 / 77 18 47 05
Face Usine NBB N'Gabakoro Droit - Bamako Rép. du Mali

FACTURE N°

Bamako, le 17/08 2016

DOIT:

QTÉ	Désignation	P. U	Montant
	Iblo	1	4500f
	Seaux	2	8000f
	Ambaale	3	6000f
	Filles 30m	30m	9000f
	Zontak	3	3000f
	Sacretone	2	1000f
	Guyane N°11	30m	9000f
	Main d'œuvre	=	5500f
	TOTAL :		46000f

Arrêté la présente facture à la somme de :

Pour Acquit

Le Fournisseur

REGION DE KOULIKORO
CERCLE DE KATI
COMMUNE RURALE DE N'GABAKORO
CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE N'GABAKORO
(SIJIMASO)

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

NOM : Sidibé
PRENOM : Aissa
DATE : 14 08 / 2016
SEXE :
AGE : 14 ans

Ordonnance

Ord	Libelles	Qté	P U	Montant
1	Cyteal solution	1 fl		3030
2	Primalan 10mg 1cp 1J le soir.	1 boîte		4610
3	Cary 500mg 1cp x 2J	2 boîtes		2240
4	Kana Cort 4mg 1 cp 1J pu 3J à la suite 1 semaine.	3 fl		7495
		TOTAL		

17.975
14.945

République du Mali
Region de Koulikoro
CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE N'GABAKORO
SIJIMASO
Médecin Chef

Prompte Rétablissement

PHARMACIE

OFFICINE SOULEYMANE DIAKITE
Bankoumbougou Route de Koulikoro Porte : 4008
Imm : Abdoulaye KEITA
BP : E3611 Tél: 20 24 56 41 / 66 72 16 20 / 76 48 88 05
Email : dr.djibrilmkite@yahoo.fr

FACTURE N° 001038 Bamako le 17/08 2016

Doit : CC ONG

Quantité	Désignation	P.Unitaire	Montant
01	Cyteal solution	3030	3030
01	Spadrap	700	700
03	Bande simple	250	750

TOTAL : 4480

Arrêté la présente Facture à la somme de : Quatre mille quatre cent quatre vingt francs CFA

Pour Acquit
Tél. 20 21 30 94
BPE 3611

Fournisseur
Tél. 20 21 30 94
BPE 3611

PHARMACIE HALEYTA

Titibougou Route de Koulikoro
Rue 5005
Tel : 20 24 36 43
Bamako

Bamako, le 25/08/2016 18:01

DOIT : 1 VENTE AU COMPTOIR
C C ONG
Bamako

FACTURE N° : 16-18587

Suivant Commande du Client :

Echéance : __/__/____

Désignations	Quantité	Prix	Montant
1. NURSIE 2 LAIT 900GBT/900G	1	6 700	6 700
2. BLEDILAIT CROISSANCE LAIT	1	3 300	3 300
3. COMPRESSE 40 X 40 MATERIEL B/10	1	1 475	1 475
4. BANDE DE GAZE 3MX10CM MATERIEL 3mx10c	3	250	750
5. EAU OXYGENEE 30V	1	1 080	1 080
6. PRIMALAN 10MG COMP SEC B/14 COMPRIME	1	4 610	4 610
		TOTAL	17 915

Arretée la présente facture à la somme de :

DIX SEPT MILLE NEUF CENTS QUINZE FRANCS CFA

POUR ACQUIT

Pharmacie Haleyta
Tél. 20 24 36 43 Bko Mali
Route De Koulikoro Rue 5005

LE FOURNISSEUR

Pharmacie Haleyta
Tél. 20 24 36 43 Bko Mali
Route De Koulikoro Rue 5005

Saisie le : 25/08/2016 Editée le : 25/08/2016

Souhaits de prompte Guérison

N° Fiscal : :

Page : 1 / 1

Station Shell TITIBOUGOU
Tél : 44 97 77 77 - Bamako
BPF 10.000F
Reçu
Nom et Prénoms : C.C ONG
Somme : Dix mille francs CFA
Pour : 12,181 gasoil
N° 08 2016
STATION SHELL TITIBOUGOU Tél: 44 97 77 77 Bamako - Mali

GENERAL TRADING
Titibougou Route de Koulikoro
Tél : 66 72 17 55 Bamako-MALI
BPF 10.000F
Reçu N° 01342
De M. CCONG
La somme de : Dix Mille Francs
Motif : Gasoil
Bamako, le 1/08/2016

GENERAL TRADING
Titibougou Route de Koulikoro
Tél : 66 72 17 55 Bamako-MALI
BPF 50000F
Reçu N° 01325
De M. X 8166 MP
La somme de :
Motif :
Bamako, le 2/08/2016

STATION VIVO ENERGY MALI
Entretient - Lavage
Shell Sotuba ACI
B.P.F 10.000F
REÇU
M.
à la somme de : dix mille francs CFA
Motif : 1 E.O.E gasoil Mac
Bamako, le 2/08/2016 N°

STATION KASSE & FRERES
Tél :(+223) 66 43 22 89 / 76 43 43 22 89
Bamako Rép. du Mali
B.P.F 5.000F
Reçu de : Gasoil 10 l Diallo
La somme de : cinq mille CFA
Motif :
N° 8166 MD Le 16/08/2016

CCONG - CUENTAS HOSPITAL DE SALA

* Metalico entregado por Laia 22.000 F
460 € 299.000 F
821.000 F
* Facturas - 249.340 F
71.660 F.
* Entrega .. 46.000 F.
40 € = 25.660 F.
71.660 F.

*FACTURAS:

- Gasolina ——— 40.000 F
- Farmacias ——— 37.340 F
- Luz ——— 40.000 F
- Madera mosquiteras — 27.000 F
- Colchon ——— 25.000 F
- Revestir colchones — 60.000 F
- Pintar cartel ——— 20.000 F

249.340 F.

Enrique Cuntin

DEVIS

Roulot	1	1000fcf
Boites de peintre blanc	2	3000fcf
Boite de peintre bleu, rouge et noir	1	1500fcf
Chiffon et scotch a papier	3	500fcf
Essence et tirage		3000fcf
La main d'œuvre		11000fcf
Total		20000fcf

Le 30/08/2016

HAMADOU GOULAKAN
Tapissier – Ebénier – Garnisseur
En Face de 6ème ARR Korofina
Bamako (MALI)
TEL : 63 00 99 01 / 79247664

Bamako, le 29/08/2016

FACTURE

TRAVAUX Revetement Matela skai

Doit :

Désignation	Qté	P.U	Montant
Revettement Matela en skai	4	15000	60 000
Total Matériaux			
Main d'œuvre			60 000
TOTAL GENERAL			

Arrêter la présente facture à la somme de : Soixante mil (60000)

Pour Acquit

Le Fournisseur

ANNEX IIII: CO·LABORADORS

Atena, Igualada

Autoservei Casals Alimentació, Teià

Bar 3r tiempo, Sports La Pava, Gavà

Bar Ca la Rosi, Teià

Bar Café de Baix, Teià

Bar Coyote, Barcelona

Bar de Costa Rasa, La Molina

Bar del Campus Ciutadella de la UPF

Bar del Campus Poblenou de la UPF

Bar del Campus Poblenou de la UPF

Bar dels Castellers de Barcelona

Bar Enric, Teià

Bar restaurant La Palma, Teià

Bramona Impressió Digital, Barcelona

Cafè de l'Artós, barri de Sarrià de Barcelona

Carnisseria Cal Tete, El Masnou

Castellers de Barcelona

Castellers de La Vila De Gràcia

Castellers de Santpedor

Conservas Ortiz, barri de Sarrià de Barcelona

Drogueria Anita, El Masnou

Ecolider Olot

El Trèvol Màgic, Teià

El Trèvol Màgic, Teià

Espai Ecològic, Tiana

Farmàcia del Passeig de la Riera, Teià

Farmàcia Dominguez, El Masnou

Farmàcia Enriqueta Lopez, barri de Sarrià de Barcelona

Farmàcia Ramón Singla, Igualada

Ferreteria Roca-Ribes, Teià

Flea Market, Barcelona

Forn de llenya Mateu, Teià

Forn Jaume I Vicens, I

Forn Jaume I Vicens, II

Frutas y Verduras Kachafruit, barri de Sarrià de Barcelona

Giving Tuesday

Igualavins, Igualada

Il Mondo del Bambino, Igualada

Il·luminacions Ca l'Oreneta, Igualada

Inquiet Bar-Cafè, Igualada

Papereria Blanc i Negre, Igualada

Papereria Codorniu, Igualada

Papereria Llibreria Quinta Amèlia, barri de Sarrià de Barcelona

Pastelería Mendieta, Barcelona

Pastisseria i Fleca Aixelà, Tiana

Pastisseria-Fleca Biel, Teià

Pel & Ploma Belles Arts i Emmarcació, Igualada

Previcat , Igualada

Queviures Marcual, Teià

Sanofi Diabetes

Sarrià Fruit Selecció, barri de Sarrià de Barcelona

S.I Turó d’en Baldiri, Teià

Tallers i Serveis Igualada SL, Igualada

802 Graphic Service, Barcelona
